

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA






AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

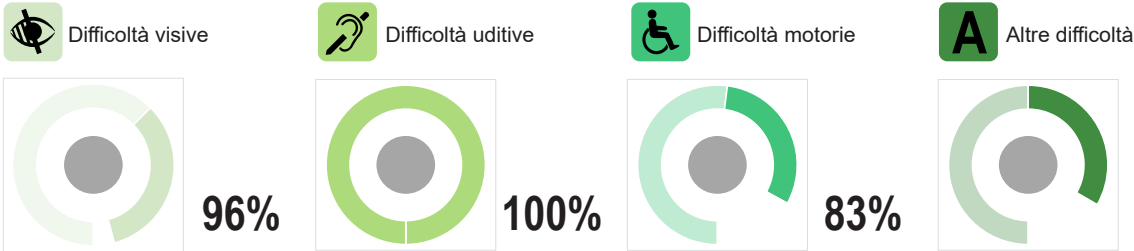
DELL'AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

PIAZZE				Interventi	Quantità
	AP	ACCESSI PIAZZA  100% 100% 85% 100%			
	CP	CORPO PIAZZA  100% 100% 72% 33%		Allargamento percorsi (m) Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad) Installazione balaustra (m) Riadeguamento della balaustra esistente con inserimento di doppio corrimano (m)	1 1 2 2
	PP	PAVIMENTAZIONE PIAZZA  100% 100% 100% 100%		Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale antisdrucciolevole e posata senza giunti nè risalti (m²) Risanamento del tratto di pavimentazione interessato (m²)	5020 4
	FF	ATTREZZATURE PIAZZA  83% 100% 75% 100%		Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)	401 4 1

LEGENDA:  Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

1	AP	
2	CP	
3	PP	
4	FF	

LIVELLO INTERVENTO

