

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

INTERVENTI



QUANTITÀ

LATO DX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)

Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad)

Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per
eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)

3



4

2

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



Rimozione del palo fissato a terra tramite demolizione di pavimentazione.
Eventuale installazione dello stesso elemento in diversa posizione (cad)

Rimozione della cabina di distribuzione utenze e sua installazione in diversa
posizione (cad)



2

3

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale
antisdrucchiolabile e posata senza giunti nè risalti (m)

Ricostruzione marciapiede (m)



88

195

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)

Integrazione impianto semaforico esistente tramite fornitura e posa in opera di
segnalatori e/o comandi adeguati (cad)

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)

Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)

Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

5

1

308

2



3

LATO SX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)

Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad)



8

1

CM

CORPO

MARCIAPIEDE





Rimozione delle radici e rifacimento del tratto di pavimentazione interessato (cad)

1

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)

Integrazione impianto semaforico esistente tramite fornitura e posa in opera di
segnalatori e/o comandi adeguati (cad)

Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)

Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)

Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

6

2

308



4

4

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE




LEGENDA:

Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma le strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO

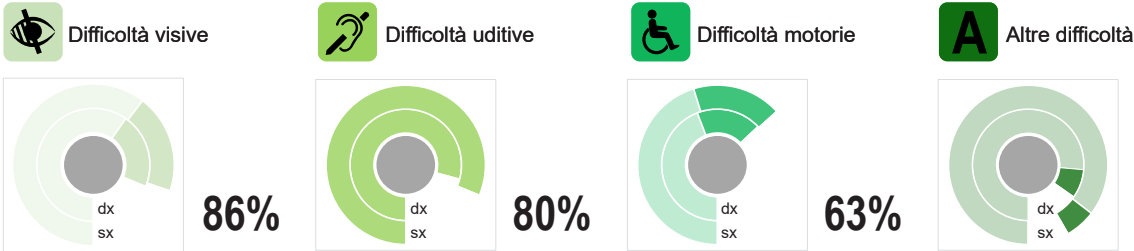

dx

sx

86%

dx

sx

80%

dx

sx

63%

dx

sx

88%

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno
antisdrucchiolabile è necessario eseguire delle prove strumentali.
L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono
subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi
e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e

multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da
assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno
coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle
normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa
pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO INTERVENTO

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono
alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	✓	✓
2	CM	✓	✓
3	PM	✓	✓
4	FF	✓	✓

